

地元関係者 各位様

通行止め期間延長のお願い

再度のお知らせ（工事箇所図追加）

発注者 飯田市役所建設部土木課

受注者 藤井興業株式会社

地域の皆様におかれましては、益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。

平素より 市道2-49号長野原線 の工事につきまして格別のご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、令和4年度 交通安全対策事業 道路改良工事 につきまして、工事を進めてまいりましたが、6月の豪雨により現場が一部被災したことにより当初予定の工程より遅れており、やむを得ず工期を延長させていただきます。地域の皆様並びに長野原線をご利用される皆様には多大なご不便をおかけしますが、できる限り工事期間の短縮に努めてまいりますので、工事へのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

※前回の配布資料の裏面に位置図を追記したものを再度配布させていただきます。

配慮が足らず申し訳ございませんでした。

工事箇所

- 工 事 名 令和4年度 交通安全対策事業 道路改良工事（一部水道工事あり）
- 工 事 箇 所 市道2-49号長野原線 飯田市 竜丘 時又（五万堂坂）
- 工 事 期 間 令和5年1月23日～令和6年2月16日（通行止めは1月31日まで）
- 規 制 内 容 工事期間内 **終日全面通行止（迂回路有）**
- 作 業 時 間 **8:00～17:00**
- 発 注 者 飯田市 建設部 土木課 整備第3係 TEL 22-4511
- 受 注 者 藤井興業株式会社 責任者 吉川和人（連絡先携帯 090-4618-0833）


残工事工程

① 準備工・起工測量・伐採工（伐採工・木くず処分）	1月下旬～2月中旬
② 法止工（法面切取工・法枠工・吹付工）-長野原側	2月中旬～4月下旬
③ 擁壁工（プレキャスト垂直擁壁・小口止擁壁 他）-時又側	5月中旬～11月下旬
④ 排水構造物工（U型側溝・BOXカルバート・自由勾配側溝）	6月上旬～12月上旬
⑤ 送水管布設工（Φ150 布設替 L=175mm）-道路内	11月上旬～12月上旬
⑥ 縁石工・舗装工（鋤取工・路盤工・表層工）-道路内	12月上旬～1月下旬

工事日程は天候やの現場状況により、変更する場合がございますのでご了承下さい。

また、工事の進捗状況により、工事期間の変更もあります。

位置図

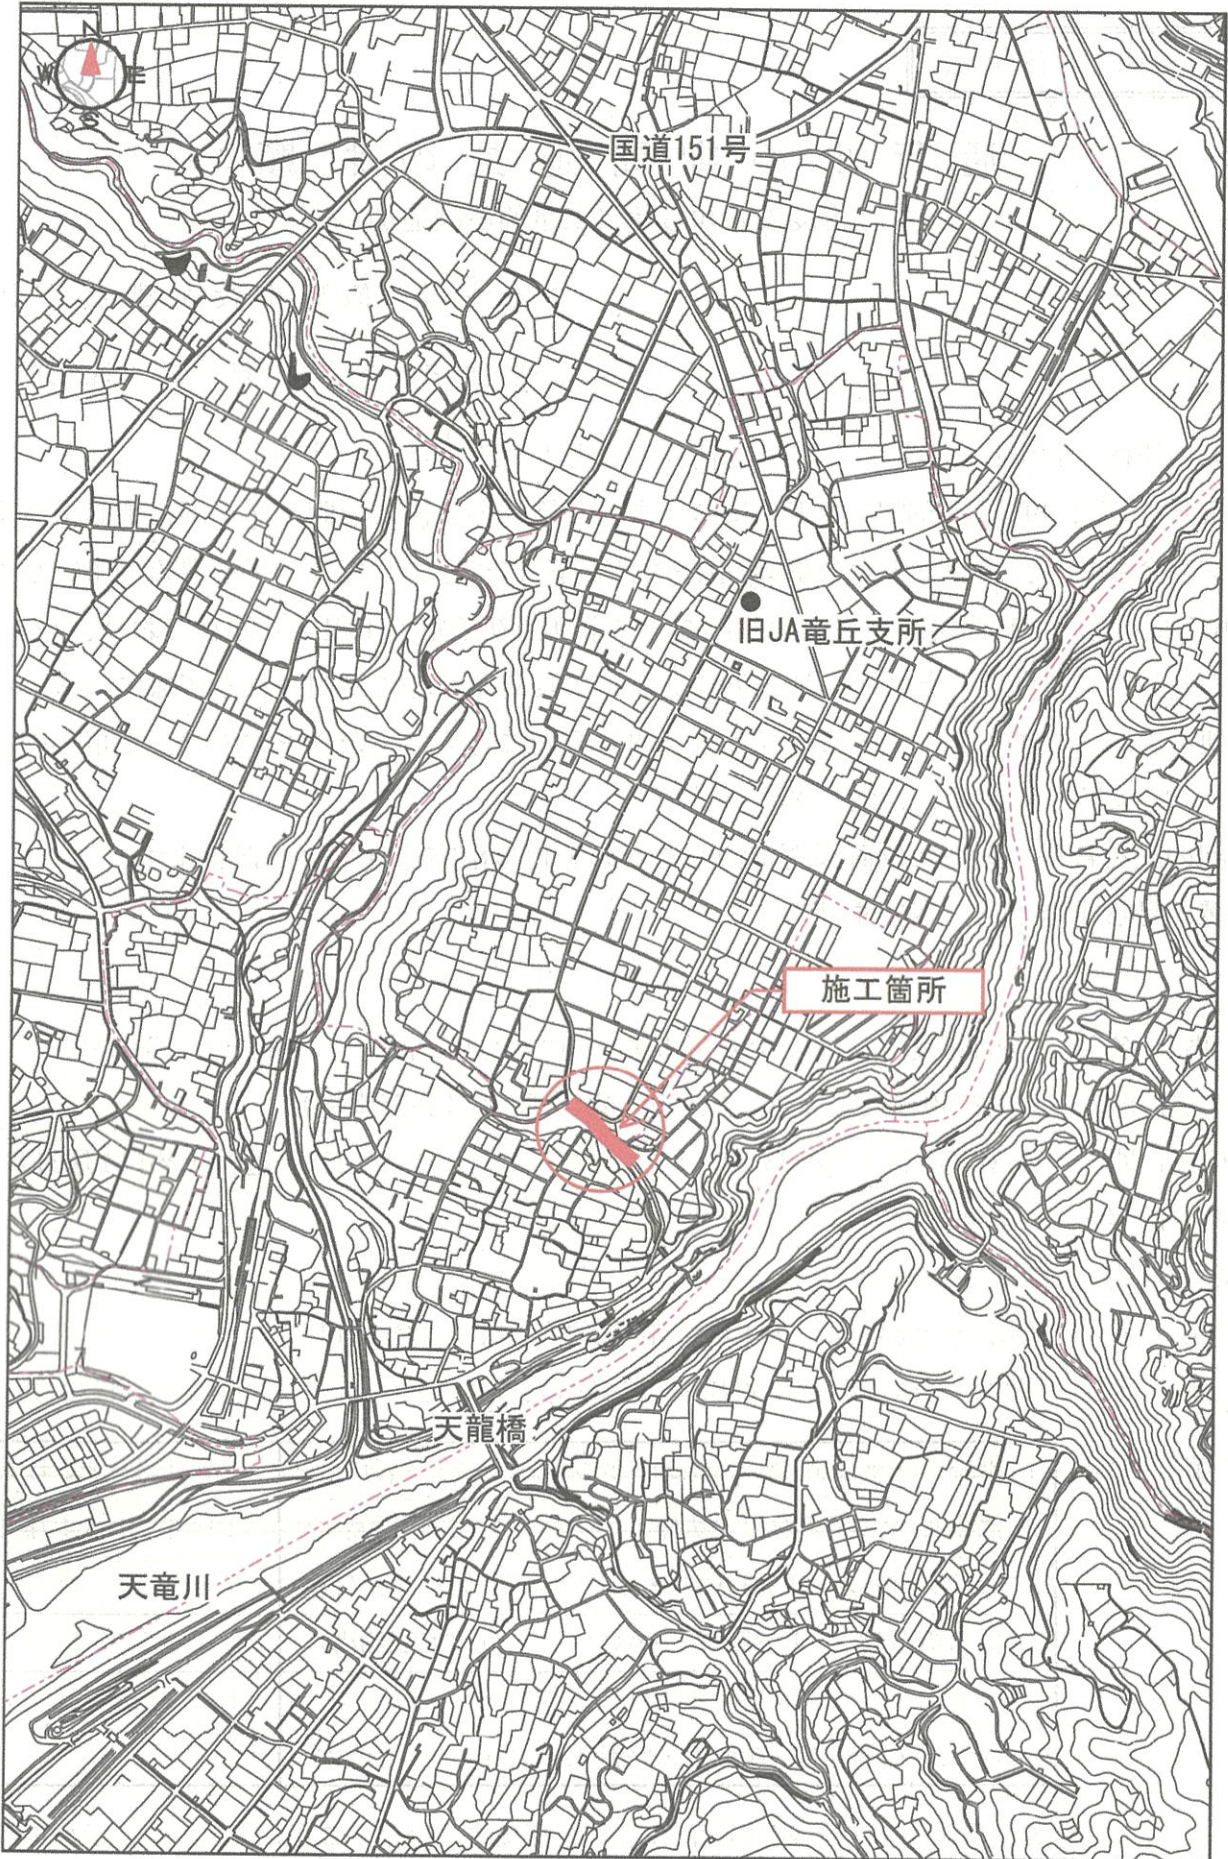

0 400m
1:10,000
